

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 11/02/11 को विद्यालय शिक्षा समिति 300 मं. वि. ग्रा. वि. विद्यालय प्रखंड मण्डल को सचिका के श्रेणी क्रमांक 125 में योजना AER-2 वित्तिय वर्ष 2010-11 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य पूरा स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अन्तिमिकरण का राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के सभी खर्च की राशियों का समायोजन करते हुए सचिका बंद करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विवरण	रुपये
1	प्रादकलित राशि	9,56,100 =
2	पूर्व में दी गई राशि(प्रथम किस्त)/कुल राशि	6,57,230 =
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि M.B.	9,45,727 =
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि	2,88,497 =
क	कटौतियाँ :-	—
(i)	वैट मद की गणना	—
(a)	कुल वैट की राशि	37,270 =
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी वैट की राशि	7,230 =
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली वैट की राशि	30,040 =
(ii)	रॉयल्टी मद की गणना	—
(a)	कुल रॉयल्टी की राशि	1,39,76 =
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि	—
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली रॉयल्टी की राशि	—
ख	पर्यवेक्षण शुल्क <u>103-932 =</u>	9,318 =
ग	पर्यवेक्षक का नाम <u>महेन्द्र कुमार पाठक</u>	—
घ	कुल कटौतियाँ	5,33,34 =
च	शुद्ध भुगतान राशि	2,35,163 =

मापी पुस्तिका के अनुसार रु० 9,45,727 = (नौ लाख पैंतालीस हजार सात सौ सात) का सामंजन होना है। पूर्व में रु० 6,57,230 = (छह लाख सात हजार दो सौ तीस) का सामंजन हो चुका है। शेष राशि रु० 9,45,727 = का सामंजन का आदेश लेखा शाखा को देना चाहेंगे।

नोट- 300 मं. वि. ग्रा. वि. विद्यालय में द्वितीय किताबें नहीं भेजी गई हैं।

(2)

प्रमाणित किया जाता है कि वि० शि०/दि० प्र० सो 3090 गे. वि. प्राङ्गन विद्या
प्रखण्ड मलवा को वित्तीय वर्ष 2010-11 के वजतीय प्रावधान के अंतर्गत Acr-3
के निर्माण हेतु प्रकलित राशि 9,56,100/- के विरुद्ध प्रथम किरत के रूप में 6,57,230.20
मात्र एवं द्वितीय किरत के रूप में रूपये को राशि निर्वह की गई थी। जिसके
विरुद्ध प्रथम समायोजन हेतु रूपये मात्र की अनुशंसा पूर्व में दिनांक को
की गई थी। जिसे लेखा शाखा द्वारा समायोजित कर लिया गया है। उक्त समायोजनोपरांत वि०
शि०/दि० प्र० सो 3090 गे. वि. प्राङ्गन विद्या प्रखण्ड मलवा के पास 9,45,727/- राशि
असमायोजित रह जाती है।

उक्त असमायोजित राशि के विरुद्ध वि० शि० सो/दि० प्र० सो ने Acr-3
का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। उक्त पूर्ण किये गये कार्य के विरुद्ध शेष असमायोजित राशि
रु० 9,45,727/- मात्र का अंतिम समायोजन किया जा सकता है।

प्रमाण स्वरूप निर्मित भवन की फोटो एवं भापी पुस्तिका की प्रति इस प्रमाण पत्र के
साथ संलग्न है।

आदेशार्थ उपस्थापित!

88/12/10/12

कनीय अभियंता
बिहार शिक्षा परियोजना
जिला: औरंगाबाद।

Durr
12/10/12

सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता
बिहार शिक्षा परियोजना
जिला- औरंगाबाद।

जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा अनुमोदित।

[Signature]
हस्ताक्षर

कोट्ट.

साठ पाठक वि०, 500 (वसा) के लीहताडेय से - (11/11/12)
88/12/10/12 के आधी से लम्बे करीब
इसे भी के साथ शक्ति निगम की जाये।

भुगतय राशि 235163/-
बैंक का नाम P+B
धनादेश चेक सं० 391423
तिथि 08/12/12

[Signature]
लेखपाल कारी
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

✓

157

M. S. Maranbigha, 3 ACR (2+1)

Block - Madanpur

Schedule XLV-Form No. 134.

Financial year (10-11)

DIVISION

Estimated cost - 956100 = ₹

SUB-DIVISION

Measurement Book

Sch. XLV-Form No. 134

791

DIVISION


SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

Certified that this measurement book have

fifty pages only —



for
D.P.O.

Name of officer

CSA A. B. G.

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of work

Situation of work-

Agency by which work is executed-

Date of measurement-

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work of 3 AC (2+1)					
In Gov. UTKMS. Marambigla					
Block - Madanpur					
Agency - V. S. S.					
Head - S. S. H. A. (baw)					
Estimate cost -					
Details Measurement					

- (1) Site clearance -
 $2 \times 4 \text{ nos @ } 104 = 208 \text{ Rs } 416 = 20$
- (2) Making 2.5 cm dia bore
 $57 \times 3.5 = 199.50 \text{ M}$
 $@ 49 = 45 \text{ Rs } 9865 = 28$
3. Making 63 cm dia underream at fixed depth
 $57 \times 2 = 114 \text{ M}$
 $@ 52 = 75 \text{ Rs } 6013 = 50$
4. Providing R.C.C. M-15 in Piles -
 $57 \times \frac{1}{4} \times 0.25 \times 0.25 \times 35714 \times 0.05 = 15.49 \text{ M}^3$
 $@ 2875 = 10 \text{ Rs } 44535 = 38$
5. E/w in excavation at foundation trenches
 Centre line length (101) for wall
 $\text{Rs } 60830.08$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
$56.50 \times 3 + 2 \times 25.67 + 2 \times 18.83$					
$= 258.50 \text{ft}$					
Area of excavation -					
Step - $1 \times 18' - 10" \times 1' - 3"$				$= 23.54$	sq ft
Butt - $6 \times 2' - 6" \times 0' - 10"$				$= 12.58$	sq ft
Gel-beam - $258.5 - 57 \times 10' - 10"$					
$\times 0' - 10"$				$= 175.838$	
Quantity of excavation -					
on step and Ramp - 115.54 sq ft					
$\times 0' - 9"$				$= 83.66$	cft
on butt - $12.50 \text{ sq ft} \times 0' - 9"$					
				$= 9.375$	cft
on gel-beam 175.83 sq ft					
$\times 0' - 9"$				$= 131.87$	cft

224.81 sq ft
6.37 cu yd

(e) $109 = 45$	Rs	697.20
6. Providing course clean		
Some filling in foundation		
on step & Ramp 11.54 sq ft		
$\times 0' - 3"$		$= 27.885$
on butt - $12.50 \text{ sq ft} \times 0' - 3"$		$= 3.13 \text{ cft}$
on gel beam - $75.83 \text{ sq ft} \times 0' - 3"$		$= 43.96$
		<u>74.97</u>
		sq ft
		2.12 cu yd
(a) 117.60	Rs	249.31
7. Providing 100A B/F/S		
on step & Ramp - 111.54 sq ft		
on butt 12.5 sq ft		
on gel-beam 175.83		
		<u>299.78</u>

Continuation

(a) 157.10 — Rs 4378.38

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
8. Providing R.C.C. (114.8) in foundation					
9m Step & Ramp					
				$10' - 3''$	
				$= 27.888$	
				cft	
				$= 0.79 \text{ M}^3$	
@ 1815.10			Rs		1433.93
9. Providing R.C.C. M-20 in g.d. beam					
$258' - 6'' \times 0' - 10'' \times 0' - 8''$					
				$= 143.61$	
				cft	
Bullt. 6x $2' - 6'' \times 0' - 10'' \times 0' - 8''$					
				$= 8.33$	
				cft	

4.301812 cfm

@ 3345.25 — Rs 14384.58

10. Providing 100A B/W in foundation & Plinth (1:6)					
9m Step					
				$1 \times 24' - 0'' \times 9' - 2'' \times 0' - 5''$	
				$= 110.07$	
				cft	
9m Ramp $\frac{1}{2}$				$10' \times 2' - 6'' \times 0' - 10''$	
				$= 18.75$	
				cft	
9m Plinth				$258' - 6'' \times 0' - 10'' \times 0' - 8''$	
				$= 358.47$	
				cft	
				487.22	
				cft	
				13.79	
				M^3	
@ 2826.40			Rs		38976.06
11. 125 mm 100A B/W (1:4)					
9m Bullt.				$6 \times 2' - 6'' \times 12' - 0''$	
				$= 180.00$	
				cft	
9m Raek				$3 \times 1 \times 1' - 6'' \times 7' - 0''$	
				$= 211.50$	
				cft	

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Deduct					
Lintel beam					
	6x2'-6"	0'-6"			
					= 7.50
					884
					204.008 ft
					18.96 M ²
	@ 377.44				Rs 7155.50
12. Providing stiff in					
each wall corner					
from g.d beam to					
scoop in R.C.M-20					
(1' x 5' x 3')					
	10x0'-10"	0'-10"	10'	12'-0"	
					= 83.266

2.360 M³

@ 3497.45					Rs 8253.98
13. Providing c/c pipe					
	1x18'-10"	4x2'-9"			
					= 29.83 ft
					9.10 M
@ 170 = w					Rs 1547 = w
14. Providing 100mm plaster					
R.C.C. M-20 in plaster					
	258'-6"	0'-10"	0'-4"		
					= 71.88 ft
on butt.	9x2'-6"	0'-5"	0'-4"		
					= 2.08 ft
					73.88 ft
					2.09 M ³
@ 3345.25					Rs 6991.57
15. Providing local sand					
filling in plaster area					
class room					
	2x22'-0"	0'	18'-0"		
					= 792
					150.00 ft
Continuation					
Stair Room	1x10'-0"	0'	18'-0"		
					= 150.00 ft

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
$2 \times 2 \times 55' - 8'' \times 6' - 0'' = 334.00$					
					8 ft
					1306.08
					8 ft
Quantity $1306.00 \text{ 8 ft} \times 1' - 10''$					
					$= 2354.33$
					8 ft
Ramp $- 1 \times 1/2 \times 18' - 10'' \times 2' - 6''$					
$\times 4' - 2'' = 98.09 \text{ cft}$					
					70.57 M ³
@ 117.60					8307.26
(16) Providing R.C.C. M-20					
in lintel beam					
Length $6 \times 4' - 6'' + 6 \times 6' - 0''$					
$\times 5' - 4'' = 88.33$					
Arch $- 4 \times 1/2 \times 5' - 9'' = 89.3$					
					183.63
$183.63 \times 0' - 10'' \times 0' - 6'' = 76.51$					
					8 ft
@ 3497.45					2.7 M ³
					7554.49
(17) Providing R.C.C. (1:1:5:3)					
Length $- 25' - 8'' + 17' - 2''$					
$- (84.33 + 11 \times 5' - 9'')$					
$= 282' - 1''$					
Lintel beam $- 282' - 1'' \times 0' - 10''$					
$\times 0' - 6''$					
$= 117.53 \text{ cft}$					
rafft $- 10 \times 2 \times 6'' \times 0' - 5'' \times 0' - 6''$					
$= 5.20 \text{ cft}$					
Bed $- 3 \times 2 \times 4'' \times 0' - 10''$					
$\times 0' - 8'' = 7.77 \text{ cft}$					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Still ben	(258 ¹ -6 ¹		171 ¹ -2 ¹		
	- 6x3 ¹ -6 ¹		4x4 ¹ -4 ¹		
	- 11x5	19 ¹	2x10 ¹ -10 ¹		
	x 0 ¹ -10 ¹	x 0 ¹ -3 ¹			6498 CFT
					19463 CFT
					5.51 M ³
@ 3497.45					RS 19270.95
18. Providing 1000 B/W in Super structure					
wall	(258 ¹ -6 ¹		171 ¹ -2 ¹		
	x 0 ¹ -10 ¹	x 10 ¹ -0 ¹			3580.30 CFT
Deduct is -					
D=	6x3 ¹ -6 ¹		x 0 ¹ -10 ¹		
	x 7 ¹ -0 ¹				

= 122.50 CFT

W=	6x5 ¹ -10 ¹	x 0 ¹ -10 ¹			
	x 5 ¹ -0 ¹				125.00 CFT
open ver.	11x5 ¹ -9 ¹	x 0 ¹ -10 ¹			
	x 5 ¹ -0 ¹				263.54 CFT
open ver.	11x	1/8 x 6 ¹ -10 ¹			
	x 0 ¹ -10 ¹				129.53 CFT
Stair	2x10 ¹ -0 ¹	x 10 ¹ -0 ¹	x 0 ¹ -10 ¹		
					166.66 CFT
from lintel	S.N. 16				76.57 CFT
from lintel	ben				
	S.N. 17				194.68 CFT
from SH 8f.	S.N. 12				83.33 CFT
					1262.87 CFT
Net Qty	2317.64				CFT

Continuation 65.62 M³

@ 3058.95 — RS 200728.30

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
19. Providing 6mm plaster & painting on top of B/W & mesh coat work waddy					
					$(258'-6'' - 171'-2'') \times 10''$
					$= 358.00$
					8 ft
					$10 \times 2'-6'' \times 0'-5'' = 10.42$
					8 ft
					368.42
					34.24 M^2
					@ 79.85
					Rs 2734.06
20. Providing R.C.C-M15 (1:2:4) in chhajja 63mm & 69mm (1:4) plaster end-to-end					
					$W = 6 \times 6'-10'' \times 2'-0'' = 72.00$
					8 ft
					$72.00 \times 2.5'' = 1800 \text{ cft}$
					0.43 M^3
					@ 3113.20
					Rs 1338.68
21. Providing 35mm thick Raek R.C.C. (1:2:4)					
					$3 \times 4 \times 3'-10'' \times 2'-4'' = 107.84$
					$107.33 \times 1.5'' = 130.42 \text{ cft}$
					$= 0.34 \text{ M}^3$
22. Providing R.C.C. in beam M-20					
					$1 \times 3 \times 19'-8'' \times 0'-10'' \times 0'-12''$
					$= 49.17 \text{ cft}$
					$= 1.33 \text{ M}^3$
					@ 3497.45
					Rs 486.46
23. Providing R.C.C-M-20 over slab					
					$57'-5'' \times 27'-6'' + 35'-6''$
					$\times 27'-6'' - 10'-0''$
					$\times 18'-0'' = 2400.42 \text{ cft}$
					$60'-4'' \times 1 \text{ continuation} \times 7'-8'' \times 1'-6''$
					$+ 37'-6'' \times 1'-6'' = 192.75 \text{ cft}$

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
Butt	10x2'	6''	x 0'-5''	= 10041 897
				2603.58971
Qty	2603.58971		x 0'-5''	= 1084.81cft 30.71 M ³
@ 3497.45				Rs 107406. 69
24. M.S. Fan hook				12 NO
@ 80.15				Rs 961.80
25 Providing for steel reinforcement in all R.C.C. work done				
Pile (frms. w. 4)				Qty 57.1345 Rs 76665.95
Cont. beam (n n 5 n 9)	15.194	2.00		303.8829
STPS. (11) 12)	83.33	2.00		166.6649
Plinth band	(11) 14)	73.88	2.00	147.7649
Chhajja	(11) 16)	76.51	2.00	153.0249
Lintel band	(11) 17)	194.68	1.00	194.6849
Chhajja	(11) 20)	15.00	2.00	30.0049
Rack	(11) 21)	130.42	2.00	260.8349
Roof	(11) 23)	1048.81	1.750	1838.4249
Jeir	(11) 31)	152.79	2.00	305.5849
Beam	(11) 22)	48.17	5.500	270.4449
				4263.9249
				4.264 M ³
@ 48500.00				Rs 206755.50
26. Providing 40mm cr. i. Pipe				
3x5				15 NO
@ 22000				Rs 330.00
27. Providing 150 # B/W (1.0)				
in 70-6				X 0'-5'' X 3'-0'' cft

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					$4 \times 5' - 9" \times 5' 11" \times 3' - 0" = 28.75 \text{ cft}$
					Steer $(9' - 5" + 10' - 6" + 4' - 0") \times 0' - 5" \times 3' - 10" = 29.90 \text{ cft}$
					<u>146.79 cft</u>
					4.155 M ³
					@ 3257.15 ————— RS 135490.74
28 providing 16 qty steel c/ce steel and					
35 x 35 x 5 mm MS angle					
on 40 x 40 x 6 mm m/cle					
panel prepared w/c D					
do do					
					$D = 6 \times 3' - 6" \times 7' - 0" = 147.84 \text{ ft}$
					$W = 6 \times 5' - 0" \times 5' - 0" = 150.00 \text{ ft}$

297.0084

27.80 M²

@ 1572.45 ————— RS 43393.62

29 providing 20 x 6 mm on MSF prepared do do

$W = 6 \times 5' - 0" \times 5' - 0" = 150.00 \text{ ft}$

$= 150.00 \text{ ft}$

$150 \text{ ft} / 15 \text{ kg} / \text{ft} = 225.00 \text{ kg}$

$= 225.00 \text{ kg}$

@ 59.70 ————— RS 13432.50

30. providing 25 mm thick (1.24) plaster and 1.5 mm thick in running green color prepared do do

Block Room $3 \times 2 \times 5' - 0" \times 4' - 0" = 192.00 \text{ ft}$

$= 192.00 \text{ ft}$

Continuation 7.84 M²

@ 118.20 ————— RS 2108.69

342100

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
31. Providing stair case in R.C.C. do-do					
Beam - $4 \times 11-8'' \times 0'-10'' \times 0'-10''$					
					$= 32.41 \text{ cft}$
Wrest slab - $(9'-5'' + 10'-6'')$					
$\times 4'-0'' \times 0'-5''$					
					$= 33.19 \text{ cft}$
Grad - $20 \times \frac{1}{2} \times 0'-11'' \times 0'-6''$					
$\times 4'-0''$					$= 18.35 \text{ cft}$
Landing $2 \times 11-8'' \times 5'-4''$					
$\times 0'-5''$					$= 51.85$
					cft
					135.78 cft
@ 3497.45 - Rs 13444.20					

32. 12 mm thick cement

floor (186) in cement

Sand ratio

9mm or Part/gravel

class room - $3 \times 2 \times (22'-0'' +$ $18'-0'' \times 10'-0'')$ $= 2400.00 \text{ cft}$ Ver. $0.1 \times 2 \times (55'-8'' + (6'-0'' + 32'-10'' + 6'$ $0'') \times 10'-0'' = 2010.00 \text{ cft}$ Stair Room $2 \times 2 (10'-0'' + 18'-0'') \times$ $10'-10''$ $= 1120.00 \text{ cft}$ D. Jams - $6 \times 17'-6'' \times 0'-10''$ $= 87.50 \text{ cft}$ W. Jams - $6 \times 20'-0'' \times 0'-10''$ $= 100.00 \text{ cft}$ Arch side - $2 \times 11 \times 5'-0'' \times 0'-10''$

Continuation

 $= 91.67 \text{ cft}$ Ver. side $11 \times 2 \times 7' \times 10'' = 46.66$ cft

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Stair railing	2x	9'-5"			
		10'-6"	4'-0"	3'-3"	
					= 155.46 sqft
Landing	2x10	2'-11"	5'-4"		
					= 108.44 sqft
Rise grade	(21x0'-6" + 20x0'-11")				
			4'-0"		
					= 115.33 sqft
					6314.70 M ²
Deduct					
D	2x6	3'-6"	7'-0"		
					= 294.00 sqft
Open ver.	4x4	4'-4"	7'-0"		
					= 121.34 sqft
Open ver.	11x5	9'-11"	5'-0"		
					= 316.25 sqft
Open ver.	2-11x7-8	5'-9"	5'-9"		
					= 142.75 sqft
Open ver.	S.N. 30				= 192.00 sqft
Stair	2x2	10'-0"	10'-0"		
					= 400.00 sqft
					1616.34 sqft
					A. 4698.36 M ²
Outer wall					
Wall	(57'-4" + 26'-6" + 34'-6" + 26'-6")			2x10'-10"	
					= 2896.67
Buff.	10x5	10'-0"	5'-0"		
					= 520.83 sqft
floor plate	70'-6" x 2x3	10'-0"			
					= 423.89 sqft
					3840.50 sqft

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Relevens					
W-6x5'-0" x 5'-0"					
					= 150.00 sq ft
Open ver. 4x4'-4" x 9'11"					
					= 121.34 sq ft
Open ver. 11x5'-9" x 5'-0"					
					= 316.25 sq ft
Open ver. 11x11'-9" x 5'-0"					
					5'-9" = 142.75 sq ft
					B 3110.16 sq ft
A+B = 725.70 M ²					
@ 56.150					RS 40639.20
32. 12 mm thick plaster (1:2:4) Cement Sand					

Length of Plinth = 167'-8"

Plinth (167'-8") x 2'-6" = 419.17

sq ft

Belt 6x (2x2'-6" x 2'-0")

= 60.00 sq ft

Step - 1x24'-10" x 3'-8" = 88.00

sq ft

567.17 sq ft

52.71 M²

@ 77.00 RS 4058.67

34. Providing 6mm (1:2:4)

Plaster Ratio in

Cement & Sand

Couple of roof

(167'-8" + 122'-0")

x 0'-6"

= 144.83 sq ft

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Ceiling -					
Class Room -	3	22'-0"	18'-0"		
					= 1188.00 sq ft
Stair Room 2x		10'-0"	18'-0"		
					= 360.00
Ver. 1x		55'-8"	32'-10"		
					X 6'-0" = 531.00
					sq ft
Coupler of w					= 15.00 sq ft
Ver. shaft -	1	5'-9"	10'-0"		
					= 82.75 sq ft
4x4	4	4'-0"	10'-0"		
					= 14.44 sq ft

Beam 3x	18'-0"	1'-10"			
					= 99.00
					sq ft
Chajja of Roof					
		60'-4"	37'-6"		
					+ 4x 7'-8" X 2'-0"
					= 195.69 sq ft
					2630.69 sq ft
					244.49 M ²

@ 47.40					11588.83
35- Providing	150	13	118		
from S.N. 15-1306					1000 sq ft
Ramp 1x	18'-10"	4'-2"			
					= 78.47 sq ft
					1384.47
					sq ft
128.67					M ²

Continuation

@ 157.10 ————— Rs 20214.56

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
36. Providing 2 inch thick (1:2:4) Cement chests, sand masonry feetent stop flooring do-do					
11.8 S.N	3x22'	1x18'	10'		
		0" x 18'	55	8 1/4	
		32	0" x 6	= 1899.00	
				881	
Row P	18'	10" x 5	20"		
				= 84.12	
				881	
				1993.12	
				881	
				185.24	

@ 243.00 ————— Rs 45180.04

37. wood work net — Rs 50

38 Providing inner
wall surface three
Coat Ceuler washy
do do

from S.N 32 A 4698.36

- 115.33 = 4588.03

881

from S.N. 20 - 2x72

= 144.00

881

from S.N. 34 = 2630.69

881

7357.72

881

683.80 ML

@ 5.75 ————— Rs 3931.85

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
39. Providing outer wall surface are					
Three Coat System					
do do					
outer wall from S.N. 32 B = 310.16 sq ft					
					289.05 M ²
@ 66.45					Rs 19207.32
40. Providing DBW (Steel) on surface one coat primer					
two coat color paint					
do do					
D = 2.25 x 6 x 3.6"					
X 7.0" = 330.75					
W = 2.25 x 6 x 5.0"					
5.0" = 337.50					
					8 PL
M11 - 6 x 5.0" x 5.0"					
= 150.00					
					5 PL
					818.25
					9 PL
					76.05 M ²
@ 11.10					Rs 844.04
41. Providing DBW one coat primer &					
two coat color paint do do					
from S.N. 40 - 818.25					
					5 PL
					76.05 M ²
@ 55.10					Rs 4189.80

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
42. Shuttering & propping work with removal in column beam					
Plinth beam etc					
rod-beam 2x258'-6"					
X 8"					= 344.06 SFT
6x2'-6" x 2x 8"					= 20.00 SFT
Plinth beam - 2x258'-6"					
X 4"					= 172.38 SFT
6x2'-6" x 2x 4"					= 10.00 SFT
Lintel - 183.63 x 2x 6"					
					= 183.63 SFT

Lintel beam 282'-11"

X 2 x 6"
= 15.00 SFT

Fill beam 308'-0" X

2 x 3" = 154 SFT

Beam 3x2x18'-0"

X 12'-0" = 108.00 SFT

1289.70 SFT

199.86 SMT

@ 12.80 ————— Rs 1350.21

43. Shuttering and propping with removal in column etc.

Column - 10x2x0'-10"

X 12'-0"

= 200.00 SFT

18.59 SMT

Continuation
@ 162.60 ————— Rs 3022.73

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
44. Shuttering & propping work with removal in chajja Roof etc.					
Chajja - 6x6'6"0"					
x 2'0"					
= 72.00 SFT					
Roof - 3x4x3'10"					
x 1'6"					
= 54.00 SFT					
Roof = 2423.58 SFT					
Stair 4x10'0" x 2x10"					
= 6.67 SFT					
(9'5" + 10'6") x 4'0"					
= 79.67 SFT					

2x10'0" x 5'4"					
= 106.67					
SFT					
2742.59					
SFT					
254.89 SMT					

@ 135.1 R 34435.64

992964.21

45. Actual Carriage cost from source to DISTC head quarter

Material	Dist	Unit	Dist	Rate	Qty	
Porter	KH72	9 hour	8	445.9	39.97	17822.62
Semi	PS	CUM	5	143	73.68	10536.24
Aggregate	Puo	CUM	40	423	63.00	26649.00
						<u>55007.86</u>
						1047972.00

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B.F 104897220					
Area from on Rent					
amt. ————			21	254320	
				1050615	
13.05/150 x 1050615				137105.25	
				93569.8	
Local charges 12%				18270.196	
				931729.99	
equality control					
Contingency 1.5%				13948.839	
suburban charge 1%				931729.99	
				955046.61	

Pay 955046.20

Nine Lakh fifty

five thousand forty

eighty only

Limit

Noted to him from
D. S. Madam

R 955046.20

Actual cost of building - R 931752.20

Add 1/2% T.C charge - R 9317.20

Add 1/2% Contingency R 4658.20

R 9,45,727.20

Less

vat

R 9,31,752.20 x 4% = R 37270.20

Royalty

R 9,31,752.20 x 1.5% = R 13976.20

8,94,481.20


(Eight lac ninety four thousand
four hundred eighty one only)

SS
12/10/12
J. G. B. B. P.

Continuation

Drum
12/10/12
M. B. P.

40

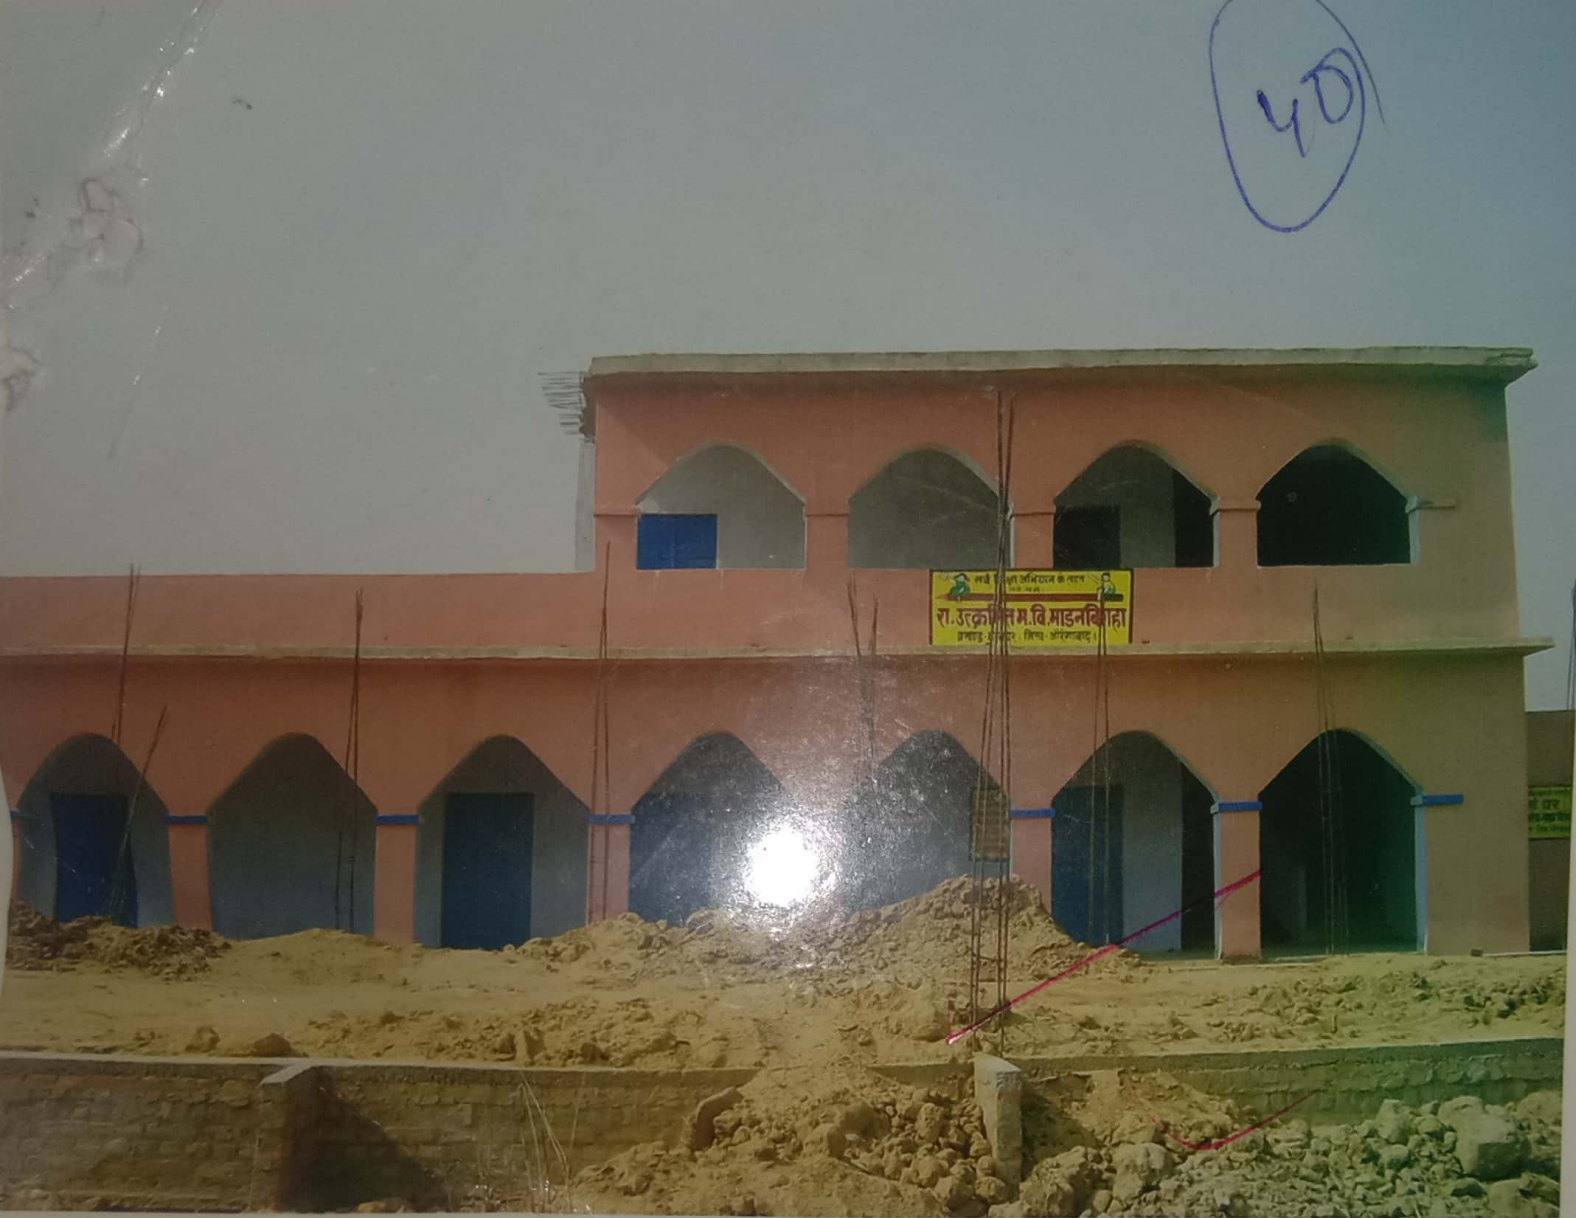

39



सेवा में

D.P.O. S.S.A. A'BAD

विषय: U.T.M.S. Madanbigha Block - Madanpur
में Financial year 10-11 के अन्तर्गत
(2+1) अन्तर Building with Stone के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के आलेख में
Building बन कर प्रेषित है। Steel Mahend-
ra Kumar Pathak को Supervisor
charge निम्न ही निम्न है।

S.O.E. का मूलक प्रति Photo (Building
का Voucher Master Book का
धरती प्रति आलेख के साथ है।

शेष तमाम Documents V.S.S.
के पास सुरक्षित है।

अतः श्री मान से अनुरोध
अह है कि भव्याशीष्ट रकम
कीट मेजने की हृष्या करे।

सेवा में

D.P.O.

महोदय

उपरोक्त विषय
के आलेख में Building (2+1) कर
की कामें समोह-पुष्ट है अतः
अनिश्चित करे हुए सामंजस
करने की हृष्या करे।

Mahendee Kumar Pathak

Mahendee Kumar Pathak

आपका विश्वास

① उपरना कुमारी

प्रभारी प्रधानाध्यापक
शा. उत्तर म. वि. मदन विन्हा
मदनपुर (औरंगाबाद)

② श्वेता कुमारी

द्वितीय शिक्षक
शा. उत्तर म. वि. मदन विन्हा
मदनपुर (औरंगाबाद)

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

(A)

37

विद्यालय का नाम - U.T.M.S. Mouranbi
खर्च की गई राशि का विवरण

प्रखंड का नाम - Maidanpur

योजना का नाम - 2+1 (30CR)

सामग्री मद का विवरण

प्रामाणिक राशि

क्रम सं०	खरीददारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिभव संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अस्युक्ति
1	2.3.11	Brick	Bhokath Brck Vdhag	01 one	33.97 Thousand	4500/ Thousa	179865=	
2)	Cement	Jankot Brck Stone	01 two	550bag	300	165000=	
3)	Stoneworks	Jankot Cement Stone	01 ^{DO}	2224.37 cft	4000/ cft	88974.8	
4)	Steel	DO	01 ^{DO}	4264kg	4500	191880=	
5	4.8.11	fresh sand	Deshh pawar	02 three	2600 cft	1200/ cft	31200=	
6)	Local sand	DO	03 ^{DO}	2650 cft	400/ cft	10600=	
7	30.5.11	Grout	Dilip Engg. works stah	05 five	240kg	60/ kg	14400=	
8)	Panel of window + Panelat	DO	005 five	710kg	65/ kg	46150=	
9	7.5.11	Cement	Jankot Cement Stone	04 four	304bag	300	91200=	
10	10.5.11	Paint	Rajesh Hand- ware Stone Maidanpur	04 four	8lit.	300	2400=	
11)	Colburn	DO	DO	180kg	20/ kg	3600=	
12)	Beush	DO	DO	4ATC	70/ ATC	280=	
13)	Primer	DO	DO	9lit.	200/ lit.	1800=	
14)	Snasem	DO	DO	150kg	60/ kg	9000=	
15	13.5.11	Ceiling and Shuttering	Surender Kumar	5	2652 8ft	14/ ft	37128=	
16	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	
21							Totals 873477=	

A+B = Total RS 873477 + RS 21250 = RS 10,85,997 =

= RS 77 Lakhs 87,3477 + 21,250 =

श्वेता कुमारी

अरुण कुमार

Passed for
9,45,727
88
7/11/12

परियोजना अधिकारी
श.उ.उ. म. वि. मंडल विभाग
मदनपुर (औरंगाबाद)

Mahendra Kumar
Dg. Maidanpur

प्रभारी प्रधानाध्यापक
श.उ.उ. म. वि. मंडल विभाग
मदनपुर (औरंगाबाद)

क्रम सं०	खरीददारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिधायक संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
कुल योग :-								

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिधायक एवं मास्टर रोल गार्ड फाइल में संचारित है।
 2. कैंस बुक, गार्ड फाइल, रटॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, सॉर्ट बुक संचारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही बही के पृष्ठ सं०-- में संचारित है।
 4. सभी अभिधायक एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक को पारा सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक

अरुण कुमार

प्रभारी प्रधानाध्यापक

रा० ए० म० वि० मडन बिगड
 बदनपुर (ओरंगाबाद)

राधिव

वि० शि० समिति

श्वेता कुमारी

सहायक शिक्षक

रा० ए० म० वि० मडन बिगड
 बदनपुर (ओरंगाबाद)

अध्यक्ष

वि० शि० समिति

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

खर्च की गई राशि का विवरण

(B)

(36)

विद्यालय का नाम- U.T.M.S Madanpur

प्रखंड का नाम- Madanpur

योजना का नाम- 2+1 (3MCR)

मजदूरी मद का विवरण

प्राकृतिक राशि-

क्रम सं०	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिध्रव संख्या	मिस्त्री/मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति	
1	2.3.11 8.3.11	Site selection Layout excavation of P.T.E. Flats below g.d. beam & casting	06 Six	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
2	9.3.11 15.3.11	B/W,	07 Seven	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
3	16.3.11 22.3.11	Local sand filling Shutting & centering Lintel beam, Arch, etc.	08 Eight	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
4	23.3.11 29.3.11	Casting of Lintel beam, mesh, gear work, etc.	09 Nine	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
5	30.3.11 5.4.11	B/W	10 Ten	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
6	16.4.11 22.4.11	B/W centering & Shooting Roof Casting of G.F.	11 Eleven	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
7	30.4.11 6.5.11	B/W Lintel beam mesh work	12 Twelve	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
8	7.5.11 13.5.11	Arch Lintel beam & Roof casting of F.F. with stair	13 Thirteen	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
9	30.5.11 5.6.11	Door, W. & grill work I.P.S. & beams, plaster	14	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
10	6.6.11 12.6.11	Plaster work	15	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
11	13.6.11 19.6.11	Painting work	16	मिस्त्री	28	250/-	7000.00		
				मजदूर	77	160/-	12320.00		
12				मिस्त्री					
				मजदूर					
13				मिस्त्री					
				मजदूर					
कुल योग :-							Total B	212520	

प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिध्रव एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।

2. कैश बुक, गार्ड फाईल स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।

3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ सं०-

में संघारित है।

4. सभी अभिध्रव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक

राजिब

अध्यक्ष

श.स. कुमारी

वि० शि० समिति

वि० शि० समिति

Maharaja Kulkarni Kumari

Pr. Madan

वरीय शिक्षक

प्रभारी प्रधानाध्यापक

रा० ए० नं० वि० मदन विंग
मदनपुर (औरंगाबाद)

रा० ए० नं० वि० मदन विंग
मदनपुर (औरंगाबाद)

34

V-2

जनहीत सीमेन्ट स्टोर

बेरी खिरियावाँ मदरसा रोड (औरंगाबाद)

पो० - ए० एन० सिंह

न०
नाम
पता

दिनांक 2.3.11

विवरण	दर	रु०	पै०
1. Cement 550bagan	3000	150000	00
2. Stone 2224.37	4000	88974.8	=0
3. Steel - 4264kg	4500	191880	=0
Paid Cement Pass for 19295854=0 Less - 8 face			
टोटल-		295854	=0

नोट :- सीमेंट, छड़, रिग, गिटो, ईट के खुदरा विक्रेता।
हस्ताक्षर

V-04

ॐ
जनहीत सीमेन्ट स्टोर

बेरी खिरियावाँ मदरसा रोड (औरंगाबाद)

प्र० - ए० एन० सिंह

न० दिनांक 7.5.14
नाम विश्वेश्वर प्रसाद
पता म.प.

विवरण	दर	रु०	प०
Cement 304 bags	300/-	91200	00
Paint & Cement less for 1/2 91200/-			
	टोटल-	91200	00

नोट :- सीमेंट, छड़, रिंग, गिट्टी, ईट के खुदरा विक्रेता ।
हस्ताक्षर
मदनपुर (औरंगाबाद)

Date 13.5.11
V-5

रा. उ. म. वि. मंडल Madentogha Block - Madentogha
उ. उ. म. वि. मंडल. M. S. / V. S. S. Madentogha

मे सुन्दर कुमारी ग्राम छोटी विद्यालय में
विद्यालय Madentogha में Roof Ceiling के
वास्तव Ceiling Study करिनि -
जिसका मूल Beam, Roof Plumber
मूल्य 2652 रु. है।
मुझे विद्यालय में 30000 रु. के
Madentogha से 14200 रु. की कमी
की गई है कुल राशि 37128 = 00200 रु.
प्राप्त हुना

Pooja Kumari
Pooja
M 3712820



अरुण कुमार
प्रभारी प्रधानाध्यापक
रा. उ. म. वि. मंडल बिगड़ा
बदलपुर (औरंगाबाद)

श्वेता कुमारी
वरीय शिक्षक
रा. उ. म. वि. मंडल बिगड़ा
बदलपुर (औरंगाबाद)

Date 4.3.11

श्री ३०३ मठवादी मंडल विद्यालय/MS. Madhav
 एच. ए. ए. Ms. Madhav
 के लिए Fresh Sand & Local Sand
 का 1 अनुमान प्रपत्र

अ. दिनेश पतिवरा राम जी
 श्री ३०३ मठवादी मंडल विद्यालय
 210 मी Fresh Sand तथा Local
 Sand पितामा विद्यालय मांछडा निर्माण
 प्रकल्प

Fresh Sand 2600 cft की मात्रा
 जो की 100 cft का मात्रा 1200 मात्रा है
 तथा Local Sand 2650 cft की मात्रा 4000/1000 cft
 Total - Fresh Sand 2600 x 1200 = 312000
 Local Sand 2650 x 400 = 106000
 cft

कुल - 418000

मुझे 21030 मठवादी मंडल विद्यालय
 वि. वि. 210।
 कुल राशि 418000 रुपये प्राप्त
 हुआ।

Paid & cleared
 Mess for
 Rs 418000/-

दि 4/3/11



अरुण कुमार

प्रभारी प्रधानाध्यापक
 शा. उ. म. वि. मंडल विद्यालय
 बदसपुर (औरंगाबाद)

श्री प्रकाश कुमार

वरिय शिक्षक
 शा. उ. म. वि. मंडल विद्यालय
 बदसपुर (औरंगाबाद)

CUSTOMER MEMO

V-04(A)

30

Rajesh Hardware Store

Durga Chowk, Madanpur (Aurangabad)

Mob:- 9204445489, 9931820249, 9905368428

नोट:- हमारे यहाँ सीमेन्ट करकट, चदरा करकट, टाटा शक्ति जी० सी० सीट, चापाकल सेट, लैट्रीन सीट, सेनेटरी का सामान, पलम्बींग पार्ट्स, जी० आई० पाईप, टाटा पाईप, नट-बोल्ट, हाइवेयर, पेन्ट्स, सेम, डिस्टेम्पर, कुटीमशीन, सी०डी० इंजन सेट इत्यादि थोक एवं खुदरा मूल्य पर मिलता है।

No.

Date.. 15/5/11

Name... *वि. वि. ०५० अ. मा. वि. म. न. वि. वि.*

Address... *Madanpur*

Qty	Particular	Rate	Rs.	P
1.	Paint - 8lit	300	2400	00
2.	Calstun - 180kg	15	2700	00
3.	Brush - 4 pce	50	200	00
4.	Primer - 9lit	170	1530	00
5.	Sandem - 150kg	225	2025	00
		65	975	00
		Total	18605	00

*Paal & Co
Peshawar
RS 18605*

E & O E

Signature

Signature

Paal & Co

हदतपुर (औरंगाबाद)

हदतपुर (औरंगाबाद)

दिव्या इंजिनियरींग वर्क्स शॉप

खिरियावाँ बाजार, मदनपुर (औरंगाबाद) 45

प्रो०:- मनोज शर्मा

हमारे यहाँ ट्रैक्टर का डल्ला, गेट, ग्रील, टेबुल, बेंच आदि का काम होता है।

नं०:-	दिनांक 30.5.11.....				
नाम	पता				
क्र०सं०	विवरण	दर	रु०	पै०	
1	Grass - 240kg	60/-	14400/-	00	
2	Panel of wood + Panel of D-710kg	65/-	46150/-	00	
<p><i>Paid & Cash</i> <i>Pass for</i> <i>Rg 60550=00</i></p>					
			कुल योग	Rs 60550/-	00
			अग्रिम	—	
			शेष	—	

नोट: 2 दिनों के उपर सामान नहीं ले जाये।
उपर सामान की जिम्मेवारी पार्टी का होगा।

Manoj Sharma

हस्ताक्षर

श० ३० नं० दि० मदन बाजार
मदनपुर (औरंगाबाद)

श० ३० नं० दि० मदन बाजार
मदनपुर (औरंगाबाद)

मास्टर रोल

प्रखण्ड..... Madhup
जिला.....

2
(27)

योजना का नाम..... योजना सं०..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता..... ति० दि० सहित (३० मई १९७७) तक
महाजन विद्यालय, मदनपुर औरनाबाद

दिनांक 9.3.11 से 15.3.11 तक

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअर्थाथ तिथि										सं.	योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या कार्य अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				किलो	दा			
1.	पशु राम प्रजापति (काँस)	शारु प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P		7	250/-				1750/-	परशुराम प्रजापति	
2.	शजिना आदत	राम शिवा आदत		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	250/-				1750/-	राजेश भादव	
3.	मनोज कास	मिश्र कास		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	250/-				1750/-	मनोज दास	
4.	शारु प्रजापति	जगदीश प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	250/-				1750/-		
5.	महेरा राम (आदत)	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-	महेरा राम	
6.	नारामण पासवान	जगदीश पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-		
7.	रामपति पाल	रामदिन पाल		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-		
8.	प्रवेश दास	चौधरी दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-		
9.	हुसेन दास	मानिकचंद दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-		
10.	उमरेश दास	नागेश्वर दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-	उमरेश दास	
11.	उपेन्द्र दास	शारु दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-		
12.	शिवनाथ पासवान	जमुना पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-		
13.	हुसैन राम	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-	हुसैन राम	
14.	शिवजी पासवान	शेखर पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-		
15.	पंडित राम	नरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-				1700/-		
कुल योग															92	160/-			7000/-	17340/-	

निरीक्षण पदाधिकारी का पल्लव एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम
 प्रभाती प्रधान, प्रधानाधिका
 १० एच० सी० वि० मदन विद्यालय
 मदनपुर (औरनाबाद)

शैलेंद्र कुमारी
 बरीय शिक्षक
 १० एच० सी० वि० मदन विद्यालय
 मदनपुर (औरनाबाद)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर


मास्टर रोल


26

प्रखण्ड..... जिला.....
 योजना का नाम..... योजना सं..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता.....
 दिनांक 16.3.11 से 22.3.11 तक

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर			
1.	पं. राम प्रजापति (का.)	शंकर प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	250/-			1750/-	परचुराम प्रजापति	
2.	राजेश भादव	राम शिब भादव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250/-			1750/-	राजेश भादव	
3.	मनोज दास	मिश्र दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250/-			1750/-	मनोज दास	
4.	शंकर प्रजापति	जनेरी प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250/-			1750/-		
5.	महेज राम (अनसूचित)	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-	महेज राम	
6.	नारामण पासवान	जनेरी पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-		
7.	रामराम पाल	रामराम पाल		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-		
8.	प्रवेश दास	चौधरी दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-		
9.	सुरेश दास	मानिकचंद दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-		
10.	उमेश दास	नारायण दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-	उमेश दास	
11.	उपेन्द्र दास	शंकर दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-		
12.	शिवनाथ पासवान	जसुना पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-		
13.	शुभदेव राम	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-	शुभदेव राम	
14.	शिवजी पासवान	शेष पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-		
15.	पंकज राम	नरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	160/-			1700/-		
कुल योग																		7000/-	17000/-	

निरीक्षण पदाधिकारी का पत्तन एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम


 प्रकाश प्रसाद
 शां. उ. सं. वि. म. वि. वि. वि.
 बलनपुर (औरंगाबाद)


 ब्रिजेश शिवरु
 शां. उ. सं. वि. म. वि. वि. वि.
 बलनपुर (औरंगाबाद)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

मास्टर रोल

प्रखण्ड.....
जिला.....

4
25

योजना का नाम..... योजना सं०..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता.....
दिनांक 23.3.11 से 29.3.11 तक.....
जिला..... प्रखण्ड.....
मालवा विभाग, मन्सूर जिलाबाद

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगूठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर			
1.	पद्म राम प्रजापति (मह)	झारू प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P		7	250/-			1750/-	पद्म राम प्रजापति	
2.	राजेश भादव	राम शिव भादव		P	P	P	P	P	P	P	P		00	250/-			1750/-	राजेश भादव		
3.	मनोज कास	विश्व कास		P	P	P	P	P	P	P	P		00	250/-			1750/-	मनोज कास		
4.	झारू प्रजापति	जनेरी प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P		00	250/-			1750/-			
5.	महेरा राम (मह)	मानिक चंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-	महेरा राम		
6.	नारामण पासवान	जनेरी पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-			
7.	रामपति पाल	रामकिन पाल		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-			
8.	पद्म कास	मोदी कास		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-			
9.	सुरेश कास	मानिक चंद कास		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-			
10.	उमरेश कास	नाथेश्वर कास		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-	उमरेश कास		
11.	डेवेड कास	झारू कास		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-			
12.	शिवनाथ पासवान	जसुना पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-			
13.	धुलटेन राम	मानिक चंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-			
14.	विजय पासवान	मोदी पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-	विजय पासवान		
15.	पद्म राम	मोदी राम		P	P	P	P	P	P	P	P		00	160/-			1700/-			
कुल योग													00	160/-			1700/-			

निरीक्षण पदाधिकारी का पदम्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

प्रखण्ड प्रमुख, मन्सूर
10 पर 50 वि० मन्सूर विभाग
बदतपुर (जोरगाबाद)

श्रीमती कुमारी
द्वितीय शिक्षक
10 पर 50 वि० मन्सूर विभाग
बदतपुर (जोरगाबाद)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर


मास्टर रोल


99

योजना का नाम योजना सं. योजना संचालनकर्ता का नाम और पता प्रखण्ड
 दिनांक 30.3.11 से 5.4.11 तक जिला

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यसंबंध तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अंगुठी का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर			
1.	पशु राम प्रजापति (अध)	शारू प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2012	250/-			1750/-	परशुराम प्रजापति	
2.	राजेश भादव	राम शिवाभादव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	250/-			1750/-	राजेश भादव	
3.	मनोज दास	मिश्र दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	250/-			1750/-	मनोज दास	
4.	शारू प्रजापति	जनेरी प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	250/-			1750/-		
5.	महेरा राम (महरी)	मानिखचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-	महेरा राम	
6.	नारामण पासवान	जनेरी पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-		
7.	रामपति पाल	रामपति पाल		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-		
8.	प्रवेश दास	शैली दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-		
9.	सुरेश दास	मानिखचंद दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-		
10.	उमरेश दास	नारेश्वर दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-	उमरेश दास	
11.	दिपेन्द्र दास	शारू दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-		
12.	शिवनाथ पासवान	जसुरा पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-		
13.	धुलटो राम	मानिखचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-	धुलटो राम	
14.	विश्वजी पासवान	शेखर पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-		
15.	पंचम राम	नरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	160/-			1700/-		
कुल योग																		7000/-	19350/-	

निरीक्षण पदाधिकारी का पन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम


 प्रकाश प्रसाद
 प्रमुख निरीक्षक
 10 पर 50 वि० मंडल विभाग
 धरमपुर (ओरंगाबाद)


 श्रीया कुमारी
 बरीय शिक्षक
 10 पर 50 वि० मंडल विभाग
 धरमपुर (ओरंगाबाद)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

मास्टर राल

प्रखण्ड.....

जिला.....

योजना का नाम..... योजना सं०..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता.....
 तक.....

दिनांक 16.4.11 से 22.4.11

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या वारों अंगुठी का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर			
1.	पशु राम प्रजापति (भाई)	शारू प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	शारू	250/-			1750/-	परचुराम प्रजापति	
2.	राजेश भादव	रामशिव भादव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	250/-			1750/-	राजेश भादव	
3.	मनोष कास	मिश्र कास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	250/-			1750/-	मनोष कास	
4.	शारू प्रजापति	जनेरी प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	250/-			1750/-		
5.	महेश राम (भाई)	भारिचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-	महेश राम	
6.	नारायण पासवान	जनेरी पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-		
7.	रामनि पाल	रामनि पाल		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-		
8.	प्रवेश कास	मोदी कास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-		
9.	सुरेश कास	भारिचंद कास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-		
10.	उमरेश कास	नागेश्वर कास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-	उमरेश कास	
11.	डेवेन्द्र कास	शारू कास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-		
12.	शिवनाथ पासवान	जमुना पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-		
13.	हुलाटेन राम	भारिचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-	हुलाटेन राम	
14.	शिवजी पासवान	शेष पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-		
15.	पंकज राम	नरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P))	160/-			1700/-		
कुल योग																		7000/-	17000/-	

निरीक्षण पदाधिकारी का पन्ना एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

प्रखण्ड प्रभारी
 श्री ० ४२० ३० वि० मं० वि०
 बदनपुर (जोरगाबाद)

श्री ० ४२० ३० वि० मं० वि०
 बदनपुर (जोरगाबाद)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर


मास्टर रोल


प्रखण्ड.....
जिला.....

योजना का नाम..... योजना सं०..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता.....
दिनांक 7.5.11 से 13.5.11 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										मं	योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायें अंगुठे का निशान			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				किलो	दर						
1.	पशु राम प्रजापति (काँ) १	कारु प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		Sevon	250/-				1750/-	परशुराम प्रजापति			
2.	राजेश भादव	रामशिव भादव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	250/-				1750/-	राजेश भादव			
3.	मनोज दास	विश्व दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	250/-				1750/-	मनोज दास			
4.	कारु प्रजापति	जनेरी प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	250/-				1750/-				
5.	महेरा राम (मधुसे)	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-	महेरा राम			
6.	नारायण पाखवान	जनेरी पाखवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-				
7.	रामराम पाठ	रामराम पाठ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-				
8.	प्रवेश दास	मोहन दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-				
9.	सुरेश दास	मानिकचंद दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-				
10.	उमरेश दास	नारायण दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-	उमरेश दास			
11.	दिवेन्द्र दास	कारु दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-				
12.	शिवनाथ पाखवान	जमुना पाखवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-				
13.	शुभम राम	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-	शुभम राम			
14.	शिवजी पाखवान	शिवजी पाखवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-				
15.	पंचम राम	नरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		17	160/-				1700/-				
कुल योग																						7000/-	17000/-	

निरीक्षण पदाधिकारी का पत्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम


 प्रकाश कुमार
 प्रभारी प्रशासक
 १० एच० सी० वि० मंडल विभाग
 बलनपुर (ओरंगाबाद)


 श्रिया कुमारी
 बरीय शिक्षक
 १० एच० सी० वि० मंडल विभाग
 बलनपुर (ओरंगाबाद)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

मास्टर रोल

प्रखण्ड.....
जिला.....


9
20


योजना का नाम..... योजना सं०..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता.....
दिनांक 30.5.11 से 5.6.11 तक

जिला.....
मंडला विभाग, मदनपुर औराबाद

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यभार तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या वार्या अंगुठी का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर			
1.	पं. राम प्रसाद (धर)	धर प्रसाद		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		250/-				1750/-	परशुराम प्रसाद
2.	शशिभा देव	राम शशिभा देव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		250/-				1750/-	राजेश भादव
3.	मनोज दास	मिश्र दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		250/-				1750/-	मनोज दास
4.	धर प्रसाद	जनेरी प्रसाद		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		250/-				1750/-	
5.	महेश राम (अन्वेष)	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	महेश राम
6.	नारायण पाखवान	जनेरी पाखवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	
7.	रामनि पाठ	रामनि पाठ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	
8.	प्रवेश दास	मोक्ष दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	
9.	सुरेश दास	मानिकचंद दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	
10.	उमरेश दास	नारायण दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	सुभाष दास
11.	उपेन्द्र दास	धर दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	
12.	शिवनाथ पाखवान	जमुना पाखवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	
13.	हुलेश राम	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	सुभाष राम
14.	निजली पाखवान	शिव पाखवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	
15.	पंकज राम	महेश राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	
कुल योग																	7000/-	17000/-		

निरीक्षण पदाधिकारी का पन्ना एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पन्ना


 प्रकाश कुमार
 प्रभारी प्रशासक
 १० एच. नं० वि० मंडला विभाग
 मदनपुर (औरबाद)


 ब्रिजेश कुमार
 वरीय शिक्षक
 १० एच. नं० वि० मंडला विभाग
 मदनपुर (औरबाद)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

मास्टर रोल

प्रखण्ड.....
जिला.....

योजना का नाम..... योजना सं०..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता.....
दिनांक 6.5.11 से 12.6.11 तक

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										योग	नगर भुगतान	अनाज		प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या वार्या अंगुठी का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर	
1.	पं. राम प्रजापति (आर)	शार प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	250/-			1750/-	परचुराम प्रजापति
2.	राजेश भादव	राम शिवा भादव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	250/-			1750/-	राजेश भादव
3.	मनोज दास	मिश्र दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	250/-			1750/-	मनोज दास
4.	शार प्रजापति	जनैरी प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	250/-			1750/-	
5.	महेरा राम (मन्ड)	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	महेरा राम
6.	नारायण पासवान	जनैरी पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	
7.	रामपति पाल	रामकिश पाल		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	
8.	प्रवेश दास	चौधरी दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	
9.	सुरेश दास	मानिकचंद दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	
10.	उमरेश दास	नारेश्वर दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	उमरेश दास
11.	डिपेड दास	शार दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	
12.	शिवनाथ पासवान	जसुना पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	
13.	हुंलदेन राम	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	हुंलदेन राम
14.	शिवजी पासवान	शेखर पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	
15.	चंद्रम राम	नखेल राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	160/-			1700/-	
कुल योग																	7700/-	19700/-

निरीक्षण पदाधिकारी का पन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

प्रभारी प्रशासकीय
रा० उ० सं० वि० मंडल विभाग
बदरपुर (ओरनाबाद)

श्रीमती कुमारी
द्वितीय शिक्षक
रा० उ० सं० वि० मंडल विभाग
बदरपुर (ओरनाबाद)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

मास्टर रोल

प्रखण्ड.....
जिला.....

11
18

योजना का नाम..... योजना सं०..... योजना संवाहनकर्ता का नाम और पता.....
दिनांक 13-6-11 से 19-6-11 तक


क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										मं	योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बार्न अंगुठी का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				किलो	दर			
1.	प.शु.राम प्रजापति (भारु)	भारु प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		250/-				1750/-	परबुराम प्रजापति	
2.	राजेश भादव	राम शिव भादव		P	P	P	P	P	P	P	P	P		250/-				1750/-	राजेश भादव		
3.	मनोज दास	मिश्र दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P		250/-				1750/-	मनोज दास		
4.	भारु प्रजापति	जनेरी प्रजापति		P	P	P	P	P	P	P	P	P		250/-				1750/-			
5.	महेज राम (अम्बरी)	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	महेज राम		
6.	नारायण पासवान	जनेरी पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-			
7.	रामराम पाल	रामराम पाल		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-			
8.	प्रवेश दास	चौधरी दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-			
9.	सुरेश दास	मानिकचंद दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-			
10.	उमरेश दास	नारायण दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	उमरेश दास		
11.	उपेंद्र दास	भारु दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-			
12.	शिवनाथ पासवान	जसुना पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-			
13.	हुमनायन राम	मानिकचंद राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-	हुमनायन राम		
14.	शिवजी पासवान	उपेंद्र पासवान		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-			
15.	पंचज राम	नरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P		160/-				1700/-			
कुल योग																	7000/-	12340/-			

निरीक्षण पदाधिकारी का पल्लव एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

प्रधानी प्रखण्ड
श्री ०८० नं० वि० बड़व विभाग
बड़वपुर (औरंगाबाद)

श्रीमती कुमारी
बरीय शिक्षक
श्री ०८० नं० वि० बड़व विभाग
बड़वपुर (औरंगाबाद)

योजना संवाहनकर्ता का हस्ताक्षर

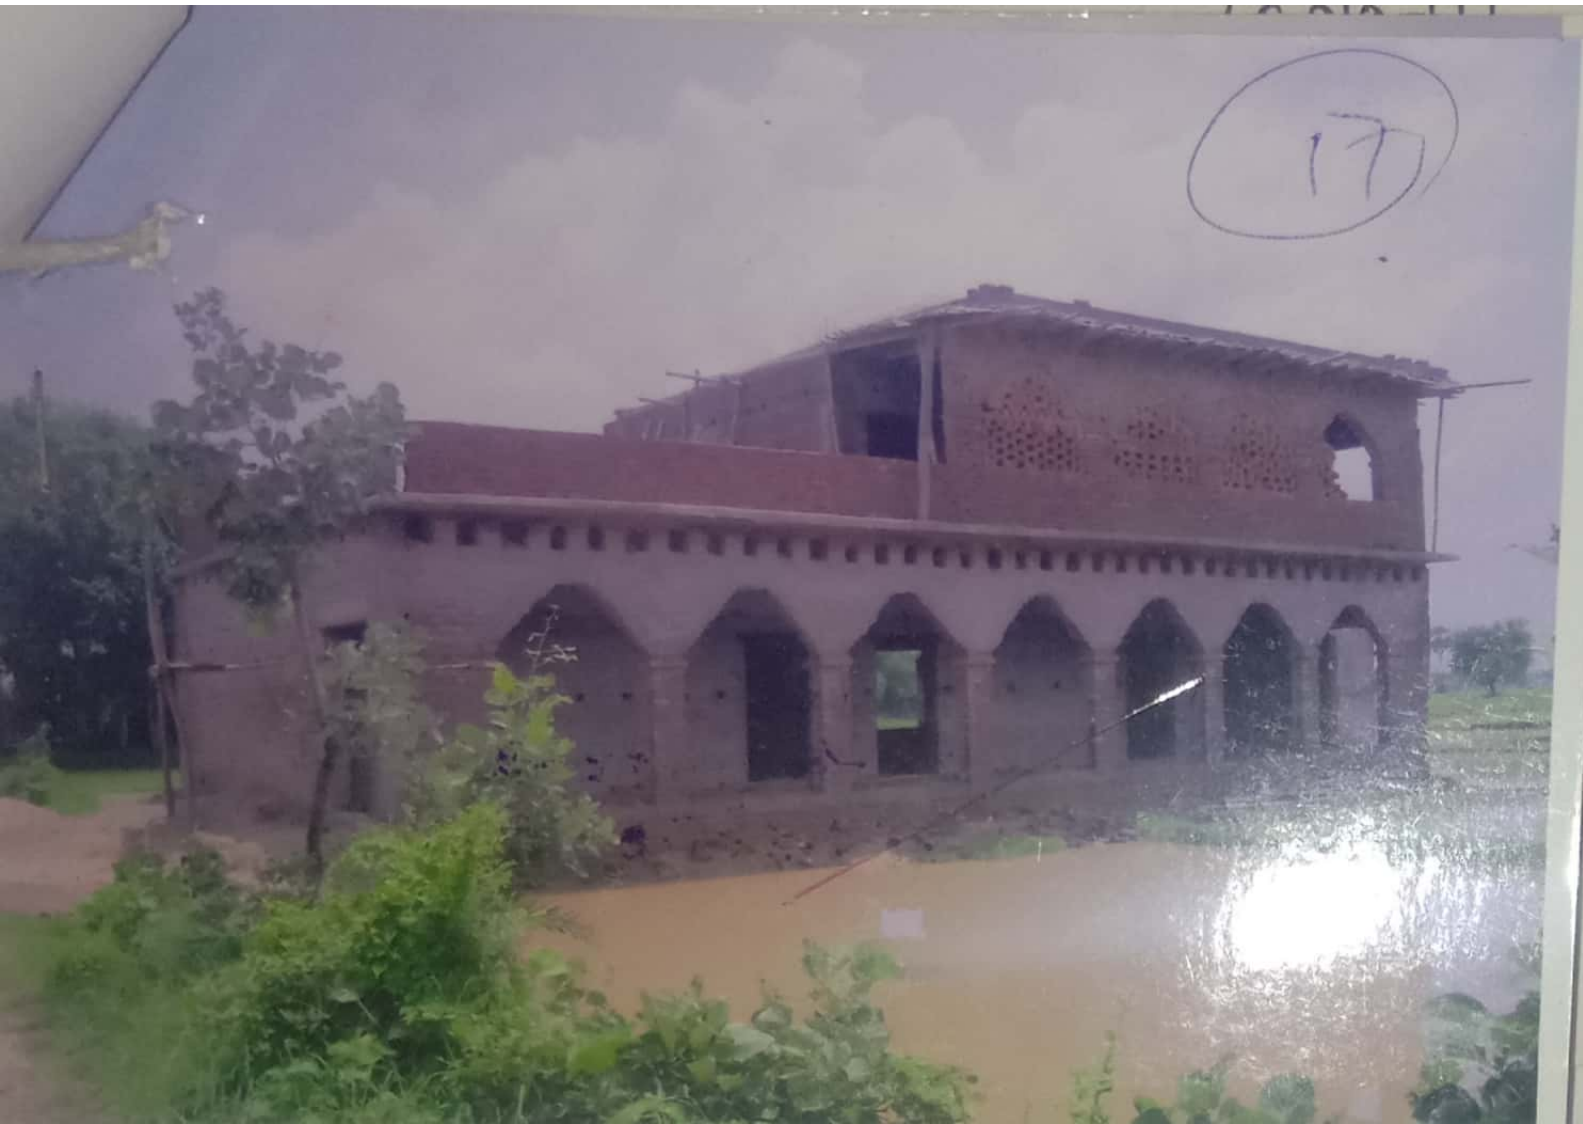



श्रीवा में

(15)

श्री मात जिना शिक्षा पदाधिकारी /
जिना शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी

श्री शिक्षा अभिमान
औरंगाबाद

विषय:- 30 मर विठ माडन विगहा, पण्ड-मदनपुर
में विविध वर्ष 10-11 में तीन आरिषिक वर्ग कक्षा
रिनिटि रूनिटि का प्रथम बिस्तर दृष्ट लागू पधार
दृष्टा (650000/-) पण्ड दुआ था।

सहाय्य

इपरोस विषय है आलोड में भवना
का दो कसरा निचे डोए एक कसरा दृष्ट का दृष्ट
की दालाई का कार्य पूर्ण हो गथा है।

श्रीवा में,
D.O. 12.9.20
श्री शिक्षा
औरंगाबाद
श्री आलोड
में कक्षा में
की अनुसंधान
या सहाय्य
Makhandakumbhar

श्री श्री मात रू

अनुसंधान है श्री प्रथा शिक्षा विविध बिस्तर
भोजने की दृष्टा रूँ नाडि रूमाय पर भवन का
कार्य पूर्ण हो रहे।

भवना में प्रयोग लाई
जो रूनी काम को भी कर
भ(उम) कि रिना लामि कि
पार प्रमा है।

अनुरा कुमा
प्रभारी प्रधानाध्यापक
30 मर विठ माडन विगहा
10 जेठ मर विठ माडन विगहा
बदनपुर (औरंगाबाद)

आपका विन्वाही

1. उपरुण कुमार
प्रभारी प्रधानाध्यापक
10 जेठ मर विठ माडन विगहा
बदनपुर (औरंगाबाद)

प्रभारी प्रधानाध्यापक
10 जेठ मर विठ माडन विगहा
बदनपुर (औरंगाबाद)

2. श्वेता कुमारी
दरीय शिक्षक
10 जेठ मर विठ माडन विगहा
बदनपुर (औरंगाबाद)

सेवा में

14

श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय
मदनपुर, औरंगाबाद

विषय :- विद्यालय भवन निर्माण कार्य के लिए
भूमि दान देने के संबंध में

महाशय

शुभिनम निवेदन इस प्रकार है कि 30 मठ किं

K.C. साइन बिगहा में विद्यालय भवन निर्माण कार्य के लिए रामचन्द्र सिंह
Report-कल पिता. धुनेश्वर सिंह, ग्राम - साइन बिगहा, पो. पिरथु, थाना - सलीमा
मिना औरंगाबाद ने भूमि दान देना चाहे हैं। दान करने वाले
मि. 5. भूमि का खाता संख्या - 11 तथा लॉट संख्या 333 हैं। रामचन्द्र सिंह
के द्वारा 6 डिसेमिटर दान स्वरूप देना चाहे हैं जिसकी चौहदी
इस प्रकार है।
पूर्व में सड़क, पश्चिम में निजि जमीन, उत्तर में निजि जमीन
दक्षिण में निजि जमीन है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि 30 मठ
जामिन का दान स्वीकार करें ताकि भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो सके।

निवेदक

उपरुण कुमार
संभारी

30 मठ किं साइन बिगहा

संभारी प्रभा

मदनपुर

मदनपुर

11336

11032

13



बिहार सरकार
जिला निबंधन कार्यालय, औरंगाबाद
Ramchandra Singh

दिनांक 28/09/2011 को निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु० 0/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 379/- निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्त्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं० 11032 के रूप में पुस्तक सं० 1 की जिल्द सं० 147 के पृष्ठ सं० 278 से 283 तक CD 23 में आज निबंधित एवं कुल 6 पृष्ठों में संधारित किया गया।

ह०
(Nigam Prakash Jwala)
निबंधन पदाधिकारी

Date : 28/09/2011

28/09/11
जिला निबंधन कार्यालय
औरंगाबाद

Serial No : Deed No :
Token No : 11387 of 2011

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
------------------------	---------------	-------	-------	-------	--------	------


Donee Governor Of Bihar

Signature of Party
Presented by
Self Ramchandra Singh



Donor
Signature of Party
Ramchandra Singh

Identifier
Signature of Party
Saty Narayan Singh



Gift - 54000/- Madampur

(2)

पत्रांक - 315 दिनांक 19-9-11

मूल्य 315 दिनांक 19-9-11 के पत्रांक के 27-9-11

Fee
NO-54
S. 150
P. 25
229

T-11 387


स्वीकृत
मा. 5

दान लेना स्वीकार किया

19-9-11
श्री. 310
मदपुर



Name of executant with full address:



1. Name: श्री रामचन्द्र सिंह

So सा मुनेखा सिंह

Resident of village: माइन सिद्धा प. 0. पिरचू

P.S.: शालैग्रा
District: औरंगाबाद

2. Name of Claimant :- GOVERNOR OF BIHAR

3. Name of nature of document - DEED OF GIFT.

4. Amount/Value: 54000

5. Extent of Property transferred 6 3/10 Acres


Decimals of land standing on plot No.- 333 (तीन सौ तीस)

Khata No. 11 (हजार छ) Village

Thana No. 759


Thana शालैग्रा District- औरंगाबाद

28/09/11



क. 44 तिथि 23/9
128.9.11

मा. 5



साही श्रीमचन्द्र सिंह वसुधिका दान पत्र लिखा गया है (छ: 3/10) (आसीन)
उपरोक्त मा. 5 विद्यालय मा. 5 निकास के पत्र के लिखने।
वसुधिका दान पत्र पं. 0. 333 मा. 5 लिखने है 18/9/11

(2010-11)

(7)

11

2.

This Indenture made this the - day of

20.....Between Sri.....

S/o..... of village.....

P.S. Subdivision

District hereinafter called the Donor of the

First Part

and

मसमहीम राजपाल विहार नगर

The State of Bihar hereinafter called the Donee of the Second Part

Whereas it is proposed to construct a.....

and whereas the said doner is the absolute owner and in possession of the immovable property described in the shedule below.

And whereas the said donor has agreed for the benefit of the public to make a free and voluntary gift of the said land to the donee, hereinafter called as site for the said.....

subject to the following conditions.....

Now this indenture witnesses-

That the said donor hereby conveys and makes a free and voluntary gift of the said land to the donee and his successor in the office together with all his right, testaments, appertenances and privilage hereto belonging for the purpose of construction of a.....


.....

TO HAVE AND TO HOLD the said land hereto granted, conveyed and transferred to and to the use of the said donee and his successor in office forever.

It is further agreed and declared that the donee and his successor in office will also pay all rents and taxes hereafter imposed or assesed on the tenant

Handwritten signature and date 26/9/11

Handwritten signature



Handwritten signature and date 23/9/2011

Handwritten signature and date 23/9/2011

प्रक

In witness whereof the said donot hath herewithset his/her hands the day month an year first above written

Schedule of the land

The above piece of land situated in village..... माइन विगाहा

P.S..... खमैगा

District..... अजमेर
having the following khata No., Plot No., area and boundry-

Khata No.	Plot No.	AREA	Boundry
11 (असह)	333 (तीन सौ तीस)	06 (छः छठे)	North- नीण रामचन्द्र सिंह South- नीण रामचन्द्र सिंह East- खंडक West- नीण रामचन्द्र सिंह

राम चन्द्र सिंह
23/9/2011

Witnesses

Signature of Donor

1. - नरसिंहाजीराव सिंह
पत्नी स्व. नरसिंहाजीराव सिंह
ग्राम - माइन विगाहा, पिरवू

2. सलोभा मदनलाल, अजमेर (विहा)
2X506665) प. 23/9/2011
'उपरान्त' सिंह


पति - श्री रामचन्द्र सिंह
ग्राम - माइन विगाहा, पिरवू
पत्नी - सलोभा, अजमेर (विहा)
23.9.11

राम चन्द्र सिंह

पति श्री नरसिंहाजीराव सिंह
ग्राम माइन विगाहा
पत्नी सलोभा मदनलाल
अजमेर (विहा)
23/9/2011



नजरी नक्शा



ख. नं. 39

कॉट. 1333


रकबा - 6 बी

पानगन (अ) ✓


मौजा - पिरबु टोला

मंडला किरा

पानग बंला

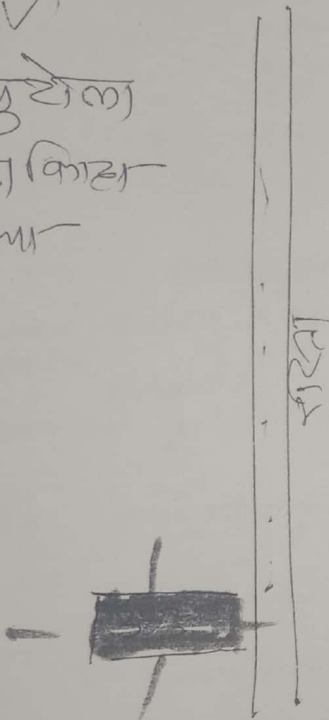

राम चन्द्र सिंह


 गवहा तं पारि किरा
 रामचंद्र पांडे

8

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 33. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	0						
Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act	Rs.	0						
(Paid Rs. 0/- by N.J. Stamp Paper and Rs. 379/- through Bank Challan.)								
FEE PAID	A1	0 C	0 H1b	0 Ka1	0 Lii	0 LLR	150	Total Fee 379
	A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 Liii	0 Proc. Fee	25	
	A9	0 DD	0 I	0 K1c	0 Mb		0	
	A10	0 E	0 J1	0 K2	0 Na		54	
	B	0 H1a	0 J2	0 Li	0 Scan		150	

Date : 28/09/2011

[Signature]
Registering Officer
Aurangabad

Endorsement under section 52

Presented for registration at 02:23 PM on Wednesday, 28th September 2011 at the District Registry Office, Aurangabad by Ramchandra Singh (Donor) Late Bhuneshwar Singh

by profession Agriculture.

[Signature]
Signature of Presentant

Date: 28/09/2011

[Signature]
Registering Officer
Aurangabad

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Saty Narayan Singh age Sex M son/daughter of Late Nand Kishor Singh resident of Vill-Madan Bigaha ,P.S- Shalaya.

Date : 28/09/2011

[Signature]
Registering Officer
Aurangabad

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO Aurangabad having 6 pages, in the volume CD-23 and document no. of which is printed on the First Page of the document.

Date : 28/09/2011

[Signature]
Registering Officer
Aurangabad

Token No. 11387 Year - 2011 Sl.No. 11336 SCORE Ver. 2.0 Deed No. 11032 NIC-Bihar

Scanned by me

[Signature]

(2010-11)

125

7

बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

पत्रांक..... 37/SCA

प्रेषक:-

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक

सं०प्रा०/सं०वि० उक्त गणवि माडन किरा

प्रखण्ड भादपुर

औरंगाबाद, दिनांक..... 6/1/11

विषय:-

अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए अपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विद्यालय को दो वर्ग कक्ष/तीन वर्ग कक्ष/चार वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि चेक नं०..... 358115..... दिनांक 19/1/11..... तथा चेक नं०..... दिनांक SBI के द्वारा क्रमशः रूपए 6,50,000-00..... तथा रूपए की राशि चेक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

आपको निर्देश दिया जाता है कि कार्य को प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक करते हुए अपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अन्दर कार्यालय में जमा करें।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक
-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान,
औरंगाबाद

चेक संख्या 358115 प्रती पात्रा
अरुणा कुमार
10/02/2011

जिला शिक्षा अधिकारी-महोदय

बिहार शिक्षा परिषदना भोजपुर

विषय: - उ० म० वि० मा० वि० वि० में आरिश्त-वर्ग इस के आवंटन के संबंध में

महोदय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहता है कि

उ० म० वि० मा० वि० वि० में छात्र एवं छात्राओं की संख्या 250 (दो सौ पचास) है। वर्तमान में मात्र 34 मी. है जो छात्रों की संख्या से बहुत कम है। जमीन उपलब्ध है एवं जमीन पर कोई विवाद नहीं है। अतः निवेदन करता है कि आरिश्त-वर्ग इस हेतु राशि निर्गत करके ही छुटा जाए।

प्रमाण के अनुसार
विद्यालय निर्माण के लिए
जमीन उपलब्ध है तथा
जमीन पर कोई विवाद नहीं है।
सि.स.
ग.स.

विश्वास भाषक
आ.प.स.।
प्रभार
उ० म० वि० मा० वि० वि०



₹ 100 = 2

5

₹ 20 = 20
अनुसूची

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.श.स.) क माध्यम से निर्माण हेतु एक एकरारनामा (एग्रीमेन्ट)

इस एग्रीमेन्ट का दस्तावेज दिनांक 02/03/11 को निम्नलिखित दोनों पक्षों के बीच तैयार किया गया,

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) तथा इनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय. (प्रथम पक्ष)।

एवं

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) उत्कृष्ट शरण विद्यालय, नरसिंहा
ग्राम मंडल, बौध प्रखण्ड मंडल, पुर
जिला अररौली और इनके अतिरिक्त प्रतिनिधि, एजेन्ट
तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित है, को कहा जाय. (द्वितीय पक्ष)।

यह कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) के नाम की एक पंजीकृत समिति है जो बिहार में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग-कक्ष, विद्यालय भवन इत्यादि का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक भाग है। उपरोक्त भवनों का निर्माण लोक भागादारी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है, जिसका अभिप्राय है कि समिति (संक्षेप में विद्यालय शिक्षा समिति) को विद्यालय भवन का निर्माण करना है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक एकरारनामा करने की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों पक्ष निम्नांकित समझौते और शर्तों को स्वीकार करते हैं :-

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश और आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे।
2. अनुबंध की राशि

निर्माण की कुल राशि (इसके बाद जिसे अनुबंध की कुल राशि कहा जायेगा)
₹ 56,100 = 20 रुपये जो स्वीकृत प्राक्कलित राशि एवं अनुमोदित नक्शा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्वीकृत है।

(2)

4

3. निधि का भुगतान

3.1 द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किसी शाखा में इस एकरारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

(क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किस्तों में (प्रत्येक किस्त प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किस्त - प्राक्कलित राशि का 75%।

द्वितीय किस्त - प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) विद्यालय शौचालय और हैण्डपंप

अग्रिम (नींव का कार्य, कुर्सी तल में ईट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम और छत की ढलाई) कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%

प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%

3.4 प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी तब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्चों का ब्योरा देंगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किस्त का 75% व्यय किया गया हो।

4 लेखा का संधारण

- 4.1 प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। पक्ष के द्वारा लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपस्थित करेंगे।
- 4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुरुपयोग के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते को निष्प्रभावी कर दे।

5. समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य.....6.....(महीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

- 6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सन्निविष्ट होगा।
- 6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राईंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।
- 6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असैनिक कार्य में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महीने में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कनीय अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य-सचिव प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपस्थित दिक्कतों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।
- 6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या काग्रेस विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से माँग करेंगे।

4

2

द्वितीय पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7.1 द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यक्तियों से कार्य कराएँगे।
- (ग) अलग-अलग कार्य मद के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेंगे।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री सारांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उपलब्ध हों, आई.एस.आई प्रमाणित चिन्ह की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निदेश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सलाहों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला परियोजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी सूचना का आवश्यक स्पर्ष्टाकरण देंगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राईंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि या सामानों का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

7.2

अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी अक्षमता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों की पूरी जवाबदेही ले और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

(5)

(1)

8. विवादों का निपटारा

यदि दो पक्षों के बीच इस एकरारनामों के भागों या कार्यों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पहले आपसी और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से विवाद को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यदि इन तरीकों से विवाद का निपटारा या पंचायत (Contribution) नहीं होता है तो इस विवाद को जिलाधिकारी/जिला के उपायुक्त के पास मध्यस्थता के लिए समुपस्थित किया जाएगा जिनका निर्णय सर्वोपरि होगा और दोनों पक्षों का मान्य होगा।

- 9. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम या परिनियम दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे
- 10. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निर्माण-मैनुअल किसी भी तरह के निर्माण कार्य या किसी भी कार्य के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश होगा।
- 11. दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा की विषयवस्तु पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर ठीक समझते हुए गवाहों के सामने अपना मुहर और दस्तखत किया।

द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....
 अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति श्री.....
सचिव,
 विद्यालय शिक्षा समिति/ श्री
 विद्यालय के
 प्रधानाध्यापक.....
 समिति की ओर से द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....
 राज्य परियोजना निदेशक, बिहार
 शिक्षा परियोजना परिषद समिति
 जिसमें इसके प्रतिनिधि, अधिकृत,
 प्रतिनिधि, एजेंट और कार्यालय में
 उनके उत्तराधिकारी शामिल है।

गवाह
 1. श्री उपेन्द्र सिंह (आदिप) / 1/1/1
 पिता - श्री स्व. जगतनाथ सिंह
 2. श्री शत्यनारायण सिंह (आदिप)
 पिता - स्व. नंदकिशोर सिंह
